

Infraestructura Rural

Nombre Infraestructura Rural

Actualizado 31 de diciembre de 2013

Descripción

Realizar la remodelación del rastro municipal de Autlan de Navarro por daños en la estructura y adecuaciones de obra civil. Así mismo la construcción, adecuación y equipamiento del rastro municipal en San Miguel Cuyutlan en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

Objetivo Brindar servicio a los ganaderos con las normas de sanidad requeridas, generando empleos directos e indirectos, así como el incremento de la engorda de ganado.

Porcentaje de Avance 50.00


Fecha de 01/01/13 **Fecha de** 31/12/13

Dependencia Secretaría de Desarrollo Urbano


Área Responsable Dirección de Infraestructura y Equipamiento

Nota No se cumplió la meta debido a algunos ajustes en los proyectos de Obra.

Cumplimiento de Metas

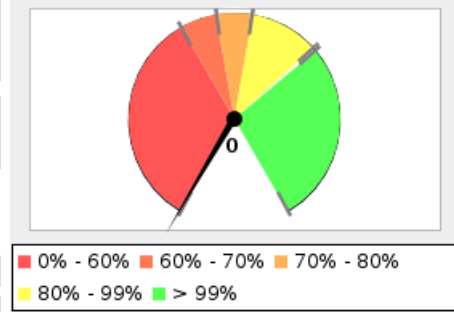

Avance Anual		
Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	0
31-oct-13	0	0
30-nov-13	0	0
31-dic-13	100	0

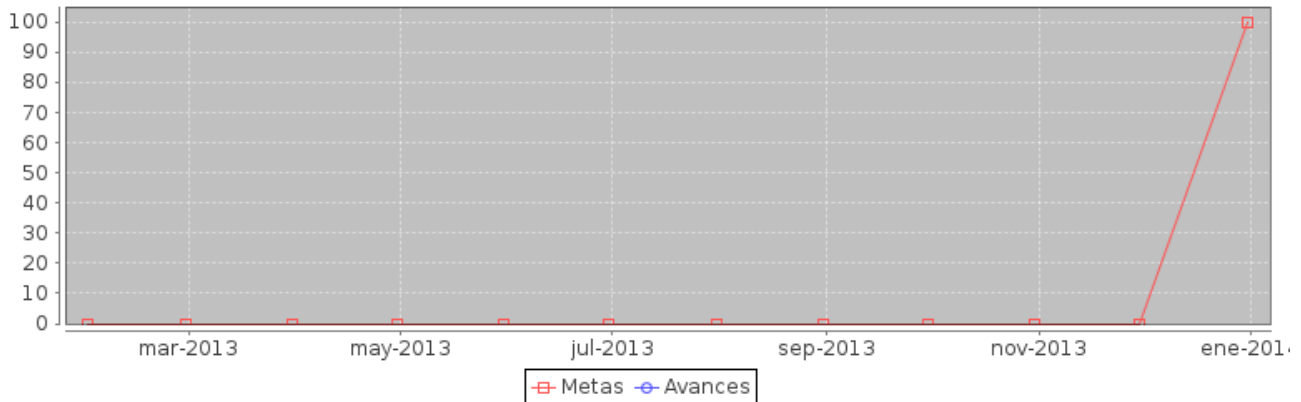

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Construcción de Rastro	0	0	1	1
2.- Remodelación de Rastro Municipal	0	0	1	0


Componente 1: Construcción de Rastro

Nombre	Construcción de Rastro		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota			

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	0
31-oct-13	0	0
30-nov-13	0	0
31-dic-13	1	1

Indicador: Inmueble construido y en operación

Nombre	Inmueble construido y en operación		
Descripción	Llevar a cabo la construcción de un rastro de Bovinos y Porcinos, en la localidad de San Miguel Cuyutlán Municipio de Taljomulco de Zúñiga.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	1

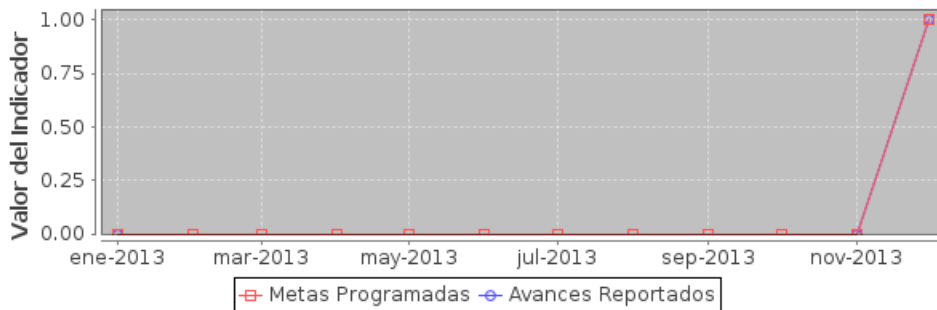

Componente 2: Remodelación de Rastro Municipal

Nombre	Remodelación de Rastro Municipal		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	31/12/13		
Nota	No se cumplió la meta debido a alguno ajustes en el proyecto de la remodelación de rastro municipal.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	0
31-oct-13	0	0
30-nov-13	0	0
31-dic-13	1	0

Indicador: Rastro remodelado y equipado

Nombre	Rastro remodelado y equipado		
Descripción	Remodelación del rastro municipal ubicado en el municipio de Autlán de Navarro, así como la construcción de la cámara de refrigeración y el equipamiento correspondiente.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	0

