

# Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara

**Nombre** Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara

Actualizado 17 de diciembre de 2013

## Descripción

Elaborar instrumentos jurídico-financieros para apoyar las acciones realizadas en la ZCG ; promover e impulsar con los kilómetros de colectores construidos, los contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano y los metros cúbicos por segundo de agua tratada: el mejorar las condiciones de vida de la población; así como, propiciar el reducir el deterioro ambiental de la región.

## Objetivo

Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, a través de la realización de instrumentos jurídico-financieros, kilómetros de colectores construidos, contratos formalizados y metros cúbicos de agua residual tratada.

## Porcentaje de Avance

67.75

## Fecha de

01/01/13

## Fecha de

31/12/13

## Dependencia

Secretaría de Desarrollo Urbano


## Área Responsable

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

## Nota


(Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara)  
No hubo recurso federal.

## Cumplimiento de Metas

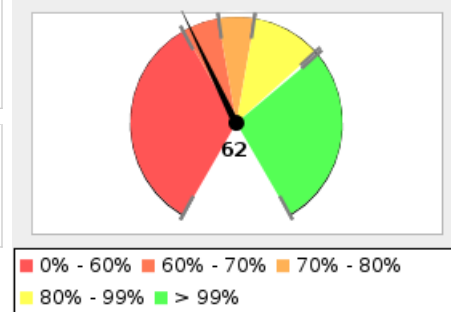

## Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	5	0
28-feb-13	11	0
31-mar-13	15	0
30-abr-13	18	0
31-may-13	23	0
30-jun-13	28	0
31-jul-13	33	0
31-ago-13	49	0
30-sep-13	59	0
31-oct-13	68	0
30-nov-13	83	0
31-dic-13	100	0

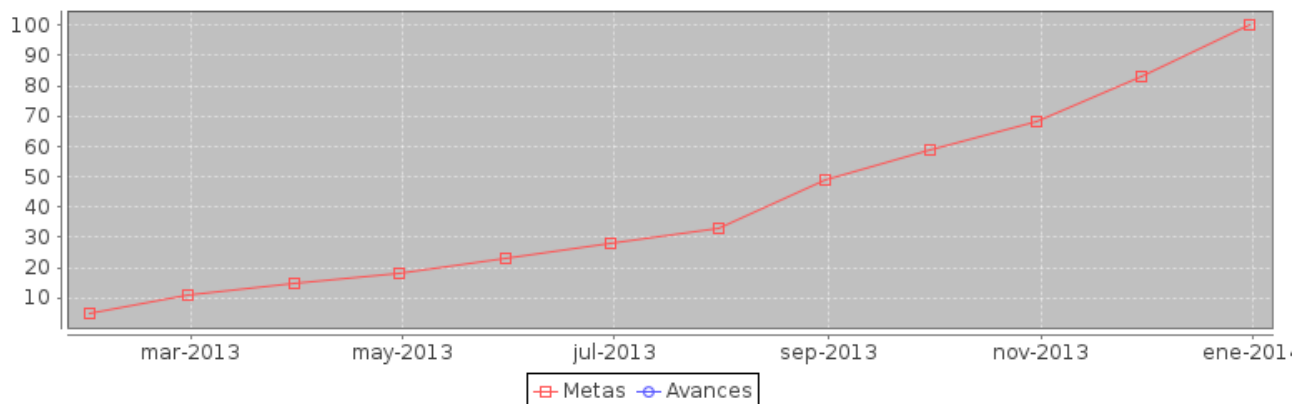

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.	19	9	19	14
2.- Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.	60	74	64	81
3.- Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.	1.64	0	3.64	0

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
4.- Metros cúbicos de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"	57715200	60936909	63072000	60936909


## Componente 1: Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.

<b>Nombre</b>	Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	17/12/13		
<b>Nota</b>	Es el avance registrado a la fecha.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	1	1
30-jun-13	1	2
31-jul-13	2	3
31-ago-13	11	6
30-sep-13	16	8
31-oct-13	19	9
30-nov-13	19	9
31-dic-13	19	14

### Indicador: Número de contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.

<b>Nombre</b>	Número de contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.		
<b>Descripción</b>	Para llevar a cabo la construcción de la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, y dotar de 5.6 m /s a la ZCG, para cubrir el déficit actual y suspender el bombeo de los pozos del Valle de Toluquilla y Tesistán; se requiere realizar acciones relativas a los procesos de contratación de: construcción, estudios y proyectos.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	14

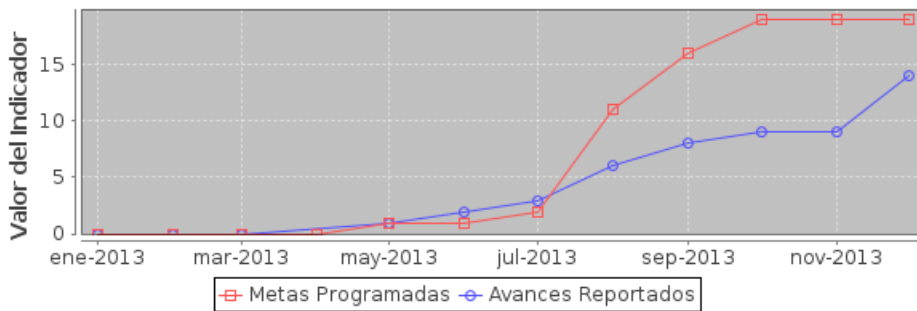


## Componente 2: Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.

<b>Nombre</b>	Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	17/12/13		
<b>Nota</b>	Es el avance registrado a la fecha.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	8	8
28-feb-13	18	18
31-mar-13	21	21
30-abr-13	25	25
31-may-13	30	30
30-jun-13	36	37
31-jul-13	39	39
31-ago-13	44	45
30-sep-13	50	67
31-oct-13	56	74
30-nov-13	60	74
31-dic-13	64	81

### Indicador: Número de instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.

<b>Nombre</b>	Número de instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.		
<b>Descripción</b>	Con la finalidad de asegurar la asignación de recursos estatales y federales para la ejecución de las acciones del programa integral de Abastecimiento y Saneamiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, se realizarán diversos instrumentos Jurídico- Financieros, en apoyo a las obras y acciones que realiza la CEA.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	81

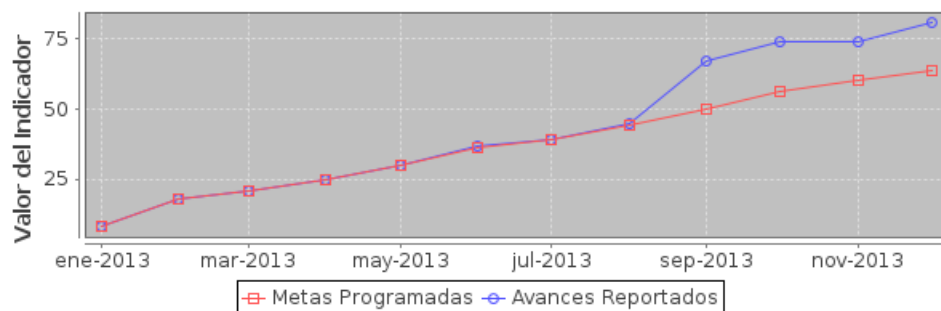

## Componente 3: Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.


<b>Nombre</b>	Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.		
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/13
<b>Última Actualizació</b>	17/12/13		
<b>Nota</b>	No se registró avance.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	0
31-oct-13	0	0
30-nov-13	1.64	0
31-dic-13	3.64	0

### Indicador: Número de kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.

<b>Nombre</b>	Número de kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.		
<b>Descripción</b>	Para reducir la contaminación del Río Santiago y sus afluentes, que fluyen superficialmente por la cuenca del Valle de Atemajac con superficie de 417 km <sup>2</sup> , incluye las Subcuencas de Coyula, Arroyo Hondo y el Caballito; así como, la cuenca del Ahogado con superficie de 520 km <sup>2</sup> , incluye la Subcuenca de Puente Grande, problema de contaminación derivado de las descargas de aguas residuales domésticas sin tratamiento y que incide en el padecimiento de enfermedades hídricas.		

Valor Inicial  Valor Actual

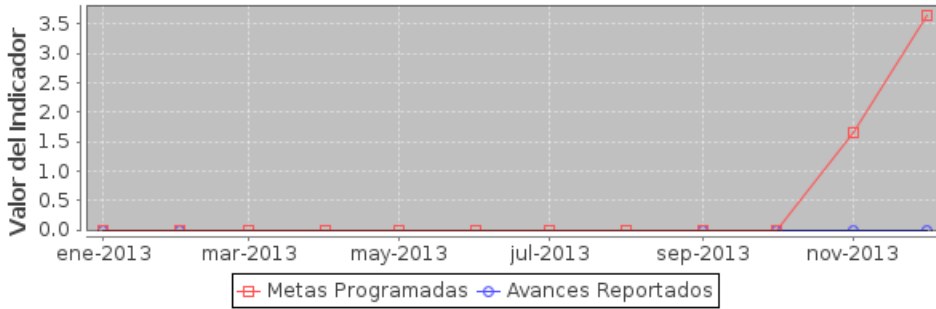

## Componente 4: Metros cúbicos de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"

<b>Nombre</b>	Metros cúbicos de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"		
<b>Fecha de</b>	<input type="text" value="01/01/13"/>	<b>Fecha de Fin</b>	<input type="text" value="31/12/13"/>
<b>Última Actualizació</b>	<input type="text" value="17/12/13"/>		
<b>Nota</b>	Es el avance registrado a Diciembre del 2013.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	5356800	4821120
28-feb-13	10185200	9175680
31-mar-13	15552000	13996800
30-abr-13	20736000	18662400
31-may-13	26092800	24153120
30-jun-13	31276800	30036960
31-jul-13	36633600	36197280
31-ago-13	41990400	42357600
30-sep-13	47174400	48837600
31-oct-13	52531200	55121030
30-nov-13	57715200	60936909
31-dic-13	63072000	60936909

### Indicador: Número de metros cúbicos de agua residual tratada en las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"

<b>Nombre</b>	Número de metros cúbicos de agua residual tratada en las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"		
<b>Descripción</b>	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado", atiende la demanda social del saneamiento en la cuenca El Ahogado; impactando benéficamente en el Río Santiago, tiene capacidad de 2,250 lps; planta dentro de la NOM-001-SEMARNAT-1996		

Valor Inicial  Valor Actual

