

Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara

Nombre Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara

Actualizado 17 de diciembre de 2013

Descripción

Elaborar instrumentos jurídico-financieros para apoyar las acciones realizadas en la ZCG ; promover e impulsar con los kilómetros de colectores construidos, los contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano y los metros cúbicos por segundo de agua tratada: el mejorar las condiciones de vida de la población; así como, propiciar el reducir el deterioro ambiental de la región.

Objetivo

Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, a través de la realización de instrumentos jurídico-financieros, kilómetros de colectores construidos, contratos formalizados y metros cúbicos de agua residual tratada.

Porcentaje de Avance

67.75

Fecha de

01/01/13

Fecha de

31/12/13

Dependencia

Secretaría de Desarrollo Urbano


Área Responsable

Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Nota


(Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara)
No hubo recurso federal.

Cumplimiento de Metas

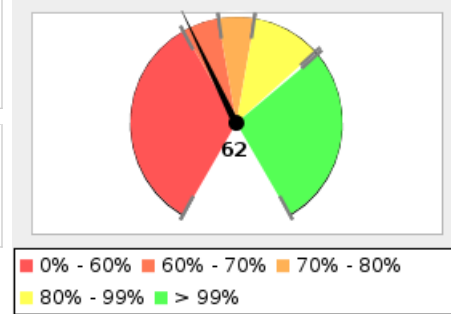

Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	5	0
28-feb-13	11	0
31-mar-13	15	0
30-abr-13	18	0
31-may-13	23	0
30-jun-13	28	0
31-jul-13	33	0
31-ago-13	49	0
30-sep-13	59	0
31-oct-13	68	0
30-nov-13	83	0
31-dic-13	100	0

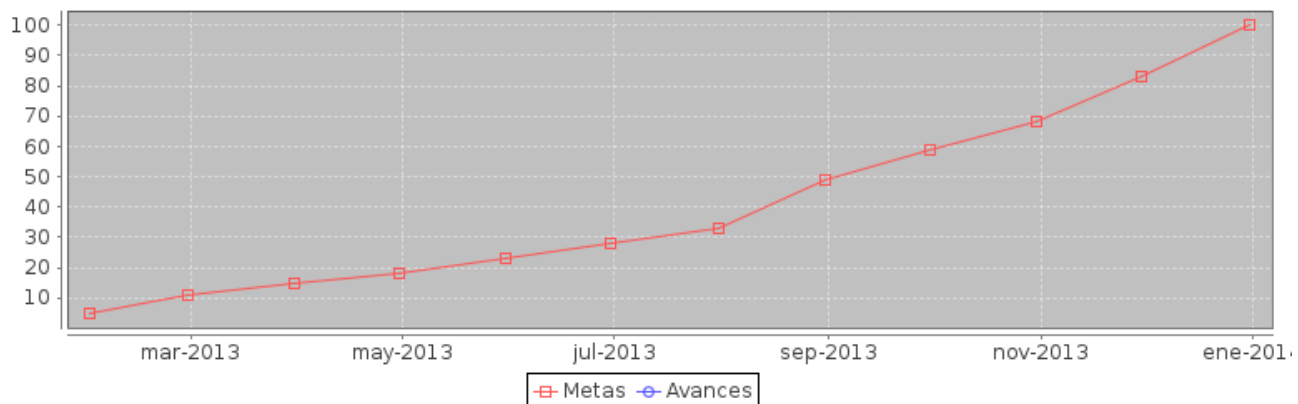

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.	19	9	19	14
2.- Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.	60	74	64	81
3.- Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.	1.64	0	3.64	0

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
4.- Metros cúbicos de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"	57715200	60936909	63072000	60936909


Componente 1: Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.

Nombre	Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	17/12/13		
Nota	Es el avance registrado a la fecha.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	1	1
30-jun-13	1	2
31-jul-13	2	3
31-ago-13	11	6
30-sep-13	16	8
31-oct-13	19	9
30-nov-13	19	9
31-dic-13	19	14

Indicador: Número de contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.

Nombre	Número de contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.		
Descripción	Para llevar a cabo la construcción de la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, y dotar de 5.6 m /s a la ZCG, para cubrir el déficit actual y suspender el bombeo de los pozos del Valle de Toluquilla y Tesistán; se requiere realizar acciones relativas a los procesos de contratación de: construcción, estudios y proyectos.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	14

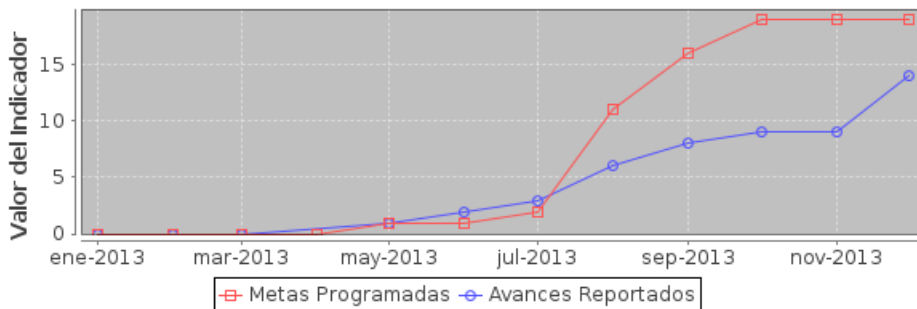


Componente 2: Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.

Nombre	Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	17/12/13		
Nota	Es el avance registrado a la fecha.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	8	8
28-feb-13	18	18
31-mar-13	21	21
30-abr-13	25	25
31-may-13	30	30
30-jun-13	36	37
31-jul-13	39	39
31-ago-13	44	45
30-sep-13	50	67
31-oct-13	56	74
30-nov-13	60	74
31-dic-13	64	81

Indicador: Número de instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.

Nombre	Número de instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.		
Descripción	Con la finalidad de asegurar la asignación de recursos estatales y federales para la ejecución de las acciones del programa integral de Abastecimiento y Saneamiento de agua de la Zona Conurbada de Guadalajara, se realizarán diversos instrumentos Jurídico- Financieros, en apoyo a las obras y acciones que realiza la CEA.		
Valor Inicial	0	Valor Actual	81

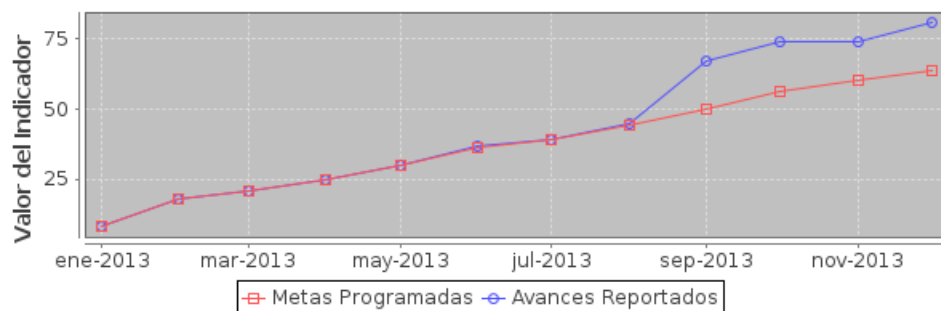

Componente 3: Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.


Nombre	Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.		
Fecha de	01/01/13	Fecha de Fin	31/12/13
Última Actualizació	17/12/13		
Nota	No se registró avance.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	0	0
30-jun-13	0	0
31-jul-13	0	0
31-ago-13	0	0
30-sep-13	0	0
31-oct-13	0	0
30-nov-13	1.64	0
31-dic-13	3.64	0

Indicador: Número de kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.

Nombre	Número de kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.		
Descripción	Para reducir la contaminación del Río Santiago y sus afluentes, que fluyen superficialmente por la cuenca del Valle de Atemajac con superficie de 417 km ² , incluye las Subcuencas de Coyula, Arroyo Hondo y el Caballito; así como, la cuenca del Ahogado con superficie de 520 km ² , incluye la Subcuenca de Puente Grande, problema de contaminación derivado de las descargas de aguas residuales domésticas sin tratamiento y que incide en el padecimiento de enfermedades hídricas.		

Valor Inicial Valor Actual

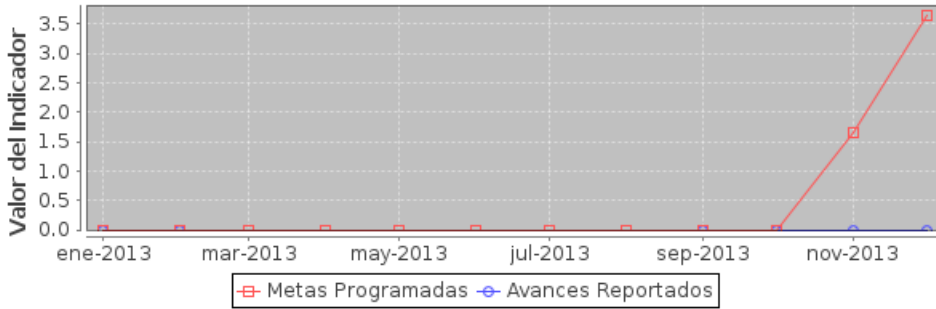

Componente 4: Metros cúbicos de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"

Nombre	Metros cúbicos de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"		
Fecha de	<input type="text" value="01/01/13"/>	Fecha de Fin	<input type="text" value="31/12/13"/>
Última Actualizació	<input type="text" value="17/12/13"/>		
Nota	Es el avance registrado a Diciembre del 2013.		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	5356800	4821120
28-feb-13	10185200	9175680
31-mar-13	15552000	13996800
30-abr-13	20736000	18662400
31-may-13	26092800	24153120
30-jun-13	31276800	30036960
31-jul-13	36633600	36197280
31-ago-13	41990400	42357600
30-sep-13	47174400	48837600
31-oct-13	52531200	55121030
30-nov-13	57715200	60936909
31-dic-13	63072000	60936909

Indicador: Número de metros cúbicos de agua residual tratada en las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"

Nombre	Número de metros cúbicos de agua residual tratada en las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"		
Descripción	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado", atiende la demanda social del saneamiento en la cuenca El Ahogado; impactando benéficamente en el Río Santiago, tiene capacidad de 2,250 lps; planta dentro de la NOM-001-SEMARNAT-1996		

Valor Inicial Valor Actual

